


Manajemen Proyek Sistem Informasi

ERP Implementation Project PT Manufacturing Indonesia



Niken Rahma Diasri
(20240803018)

@reallygreatsite | hello@reallygreatsite.com | 123 Anywhere St., Any City

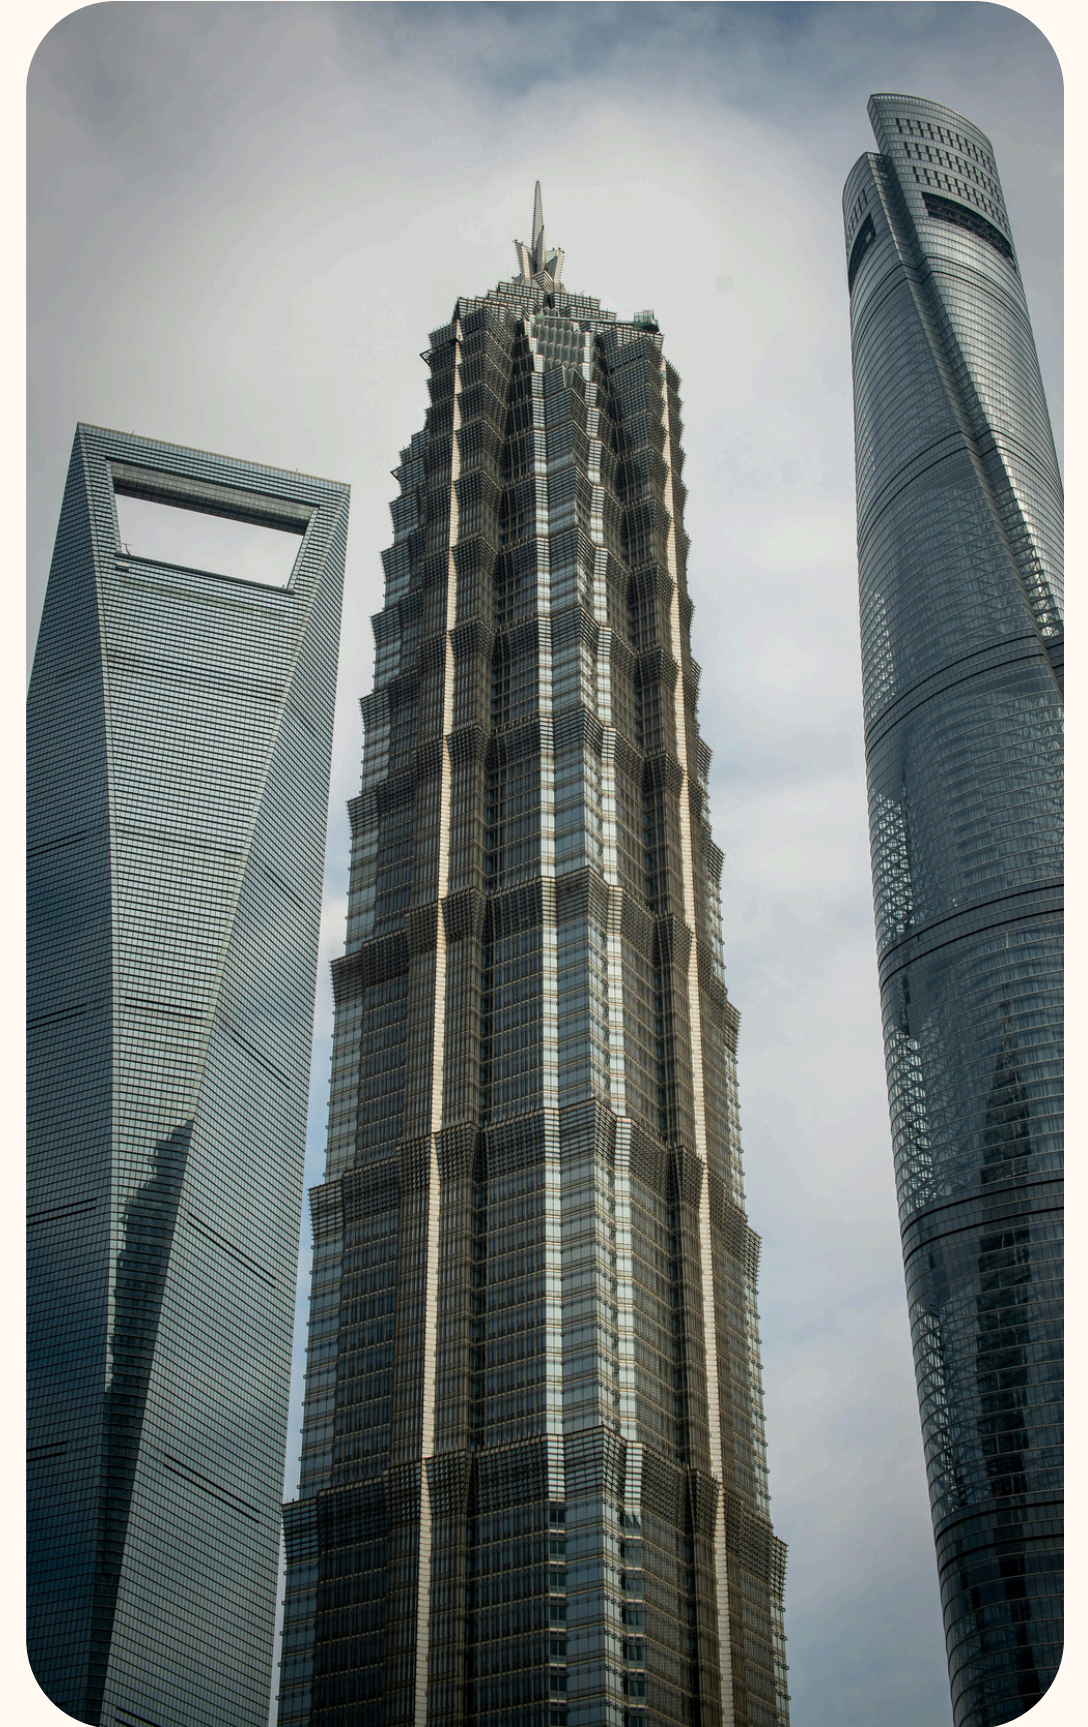

LATAR BELAKANG



PT Manufacturing Indonesia menghadapi masalah akibat penggunaan sistem yang belum terintegrasi antar departemen, seperti data yang terpisah, keterlambatan laporan, dan kesulitan memperoleh informasi secara real-time.

Solusi yang dipilih adalah implementasi Enterprise Resource Planning (ERP) yang menghubungkan:

- Production Management
- Inventory Management
- Procurement
- Finance
- Human Resource

Project Information:

- Budget: Rp1.500.000.000
- Duration: 24 minggu
- Sponsor: CEO PT Manufacturing Indonesia

Project Objectives & Scope

STRATEGIC OBJECTIVES:

- Mengintegrasikan proses antar departemen.
- Mengurangi proses manual dan duplikasi data.
- Menyediakan informasi real-time untuk pengambilan keputusan.

SCOPE PROJECT:

Included:

- ERP Configuration
- Data Migration
- Testing
- User Training
- System Deployment

Excluded:

- Membuat ERP baru dari nol.
- Mengganti mesin produksi.
- Membuat aplikasi customer.

Tujuan utama proyek ERP adalah meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung transformasi digital perusahaan.

Business Case & Cost Benefit Analysis

Investasi awal proyek:

Rp1,5 Miliar


Estimasi manfaat tahunan:

Rp700 juta/tahun

Hasil analisis:

- Payback Period: 2,5 Tahun
- ROI: 40%

Berdasarkan hasil tersebut, proyek dinilai layak dilanjutkan karena memberikan keuntungan finansial sekaligus meningkatkan efektivitas operasional perusahaan.

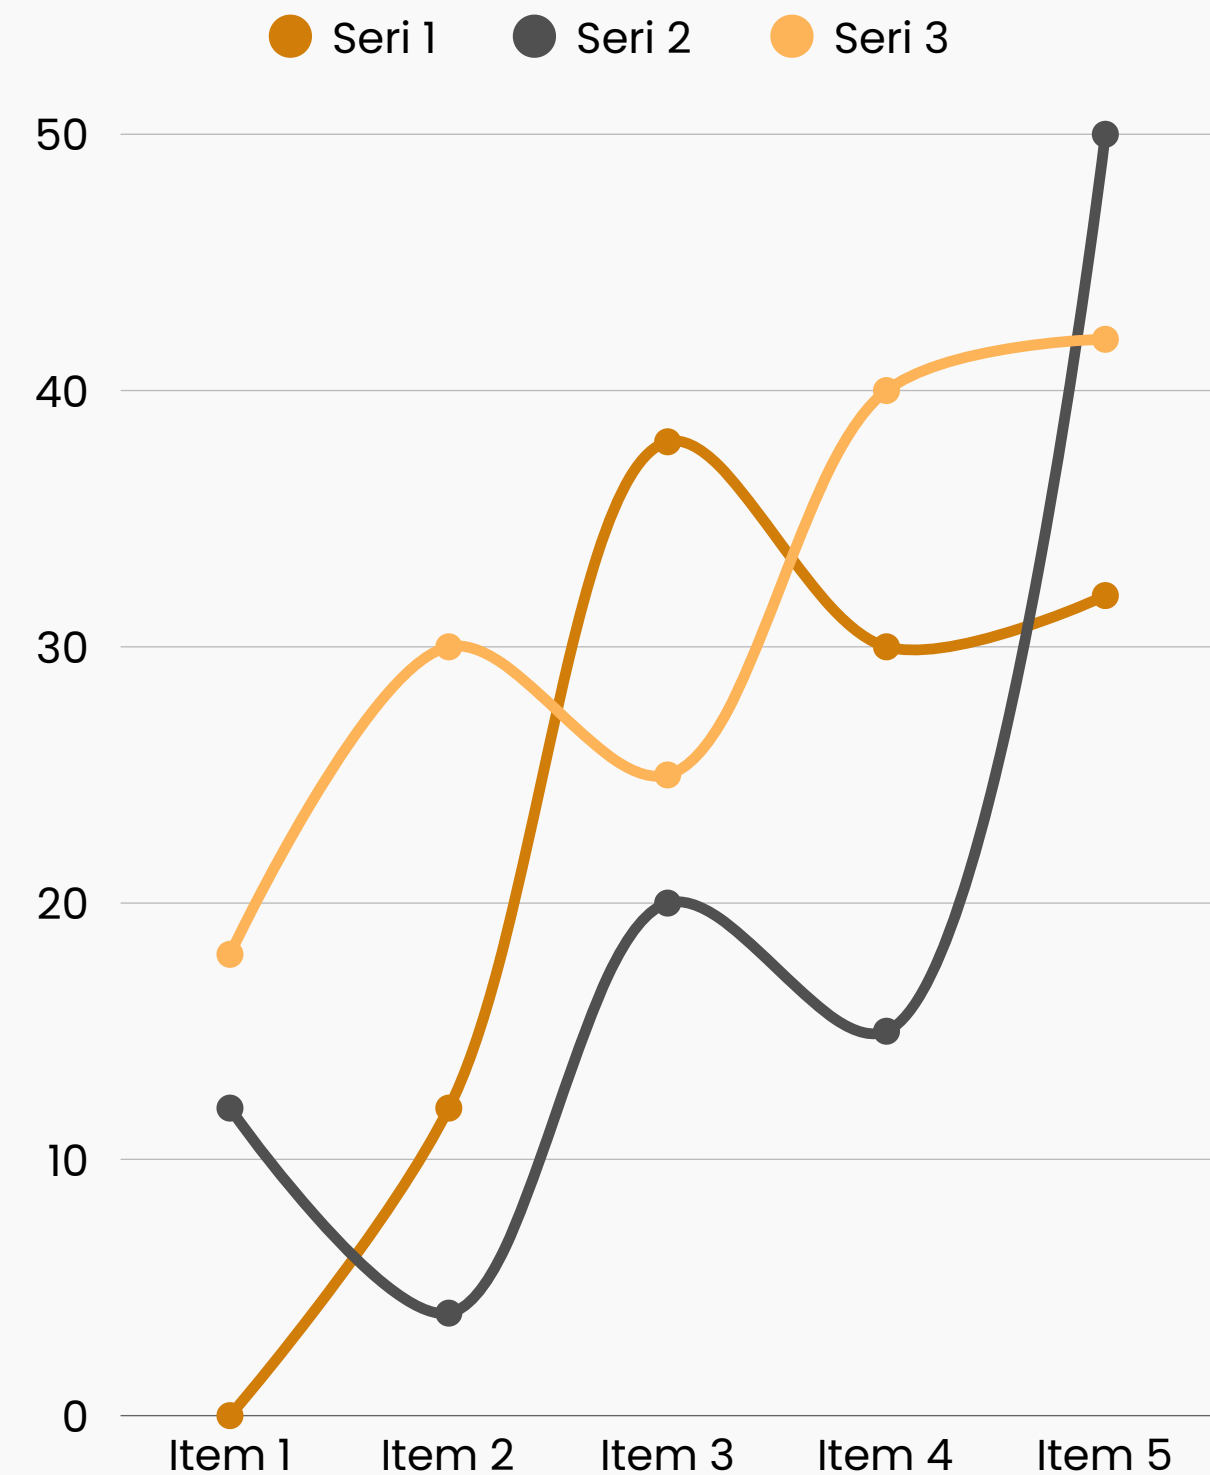

PERENCANAAN PROJEK DAN METODOLOGI

Hybrid Methodology

Metode ini dipilih karena ERP membutuhkan perencanaan yang terstruktur, tetapi tetap membutuhkan fleksibilitas ketika dilakukan konfigurasi dan testing berdasarkan feedback pengguna.

Tahapan utama:

1. Project Initiation
2. Requirement Analysis
3. ERP Configuration
4. Data Migration
5. Testing
6. Training
7. Deployment

Schedule & Cost Estimation



Cost Estimation

Module	Estimated Cost
Production Management	Rp308 juta
Inventory Management	Rp258 juta
Financial Management	Rp250 juta

Manajemen Anggaran dan Tenaga Kerja

Project Schedule (CPM)

Critical Path:

A1 → A2 → A3 → A4 → A5 → A6 → A8 → A9 → A10 → A11 →
A12 → A13

Total estimasi:
170 hari kerja

Total estimasi:
Rp816 juta
Contingency reserve:
15% = Rp122,5 juta

Risk & Quality Management



RISIKO UTAMA DALAM IMPLEMENTASI ERP:

- Data Migration Failure Risiko terbesar karena kesalahan data dapat memengaruhi sistem.
- User Resistance Pengguna membutuhkan adaptasi terhadap proses baru.
- Schedule Delay Testing dan konfigurasi dapat membutuhkan waktu tambahan.

MITIGASI

- Data testing dan backup.
- Pelatihan pengguna.
- Monitoring progress mingguan

TESTING

- Unit Testing
- Integration Testing
- System Testing
- UAT
- Performance Testing

Team, Communication & Procurement

Project Team

Tim utama terdiri dari:

- Project Sponsor
- Project Manager
- Business Analyst
- ERP Consultant
- IT Team
- Database Administrator
- QA Tester

Communication Plan

Komunikasi dilakukan melalui:

- Daily meeting
- Weekly progress report
- Steering committee meeting

Procurement

Pengadaan utama:


ERP Software License + Implementation Consultant

Kontrak:

Fixed Price Contract

Alasan:

- Mengontrol biaya.
- Mengurangi risiko tambahan biaya dari vendor.

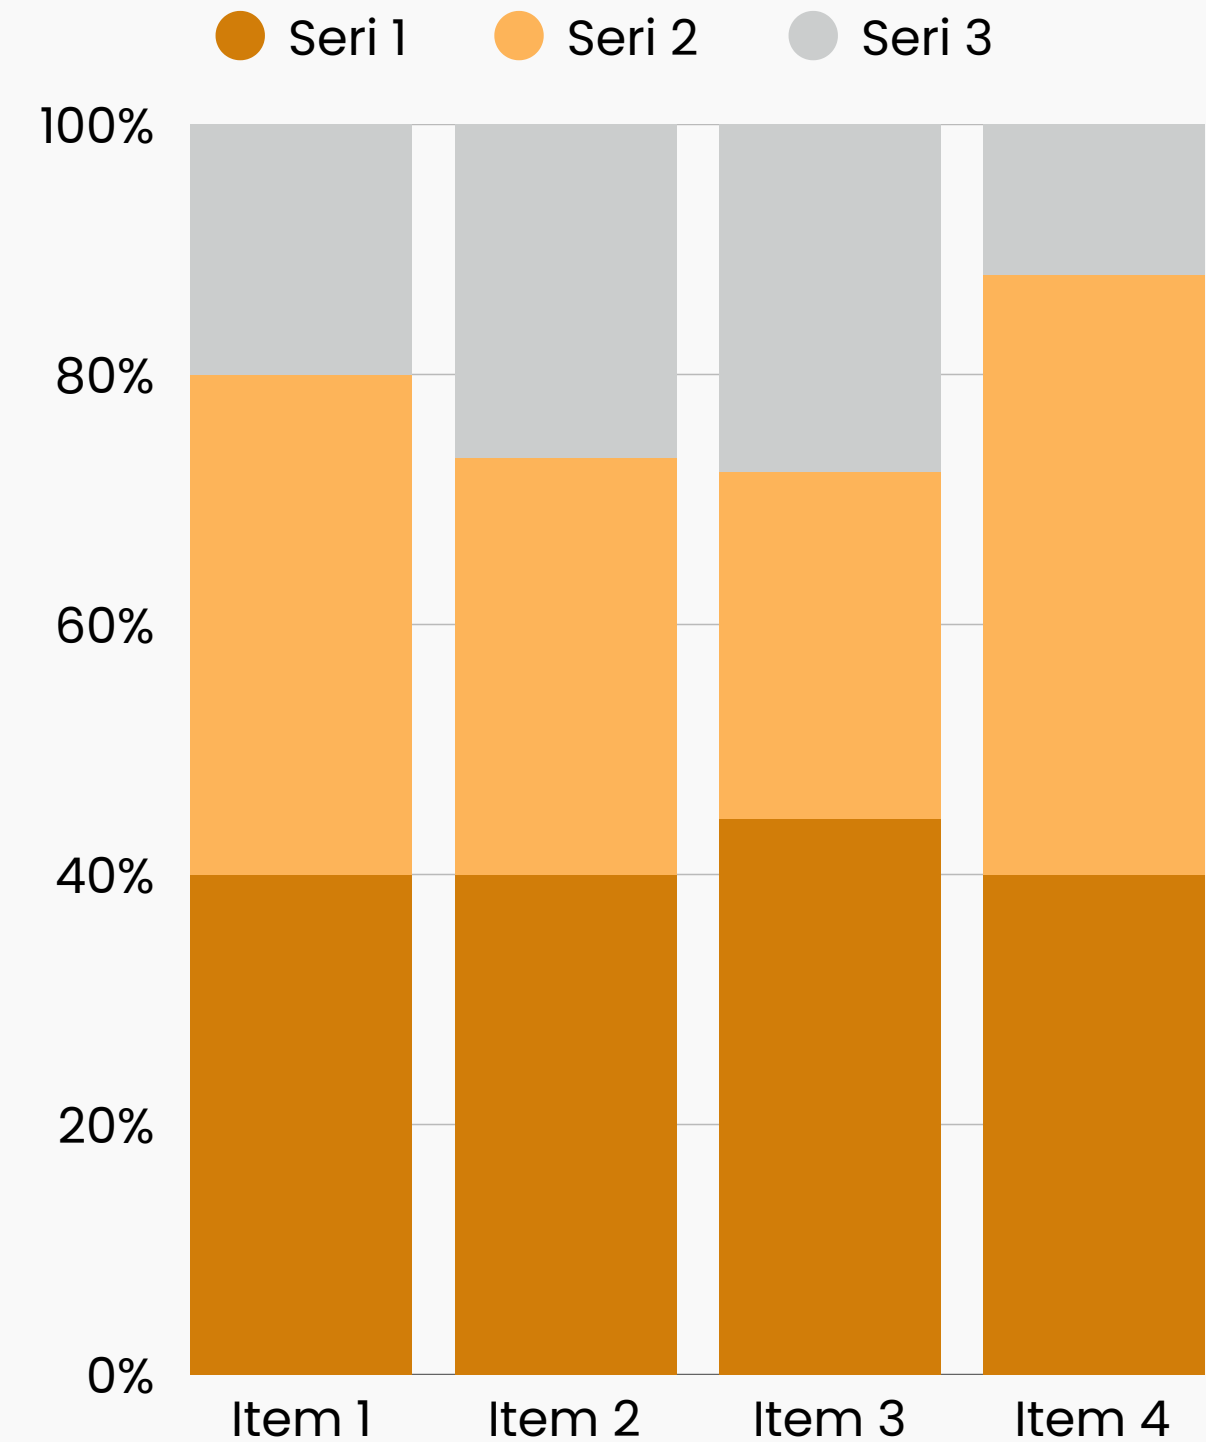



Deployment & Change Management

Strategi Implementasi ERP

ERP deployment menggunakan metode Phased Deployment untuk mengurangi risiko implementasi dan membantu pengguna beradaptasi secara bertahap terhadap sistem baru.

PHASE 1 PRODUCTION & INVENTORY

Implementasi modul produksi dan inventory sebagai proses utama operasional perusahaan.

PHASE 2 PROCUREMENT & FINANCE

Penerapan modul pengadaan dan keuangan untuk mendukung proses bisnis pendukung.

PHASE 3 HR & SYSTEM OPTIMIZATION

Implementasi modul HR serta melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem setelah digunakan.

Monitoring, Closure & Conclusion

EVM Result

Pada minggu ke-12:

$SPI = 0,75$

→ Proyek mengalami keterlambatan.

$CPI = 0,83$

→ Penggunaan biaya belum efisien.

EAC terbaik:

Rp2,22 Miliar

KESIMPULAN

ERP Implementation Project

memberikan manfaat strategis bagi PT Manufacturing Indonesia dengan mengintegrasikan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Keberhasilan proyek bergantung pada:

- Dukungan manajemen.
- Kesiapan pengguna.
- Pengendalian risiko.
- Monitoring proyek yang konsisten.

Terima Kasih



Oleh: Niken Rahma Diasri

